


ID	Aktivitetsnr.	Aktivitetstittel	Aktivitetstekst	Variighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
1							
2		Aurelian - Fase 1 (Forundersøkelser)		68 dager	02.02.26	13.05.26	
3		Prosjekt admin		68 dager	02.02.26	13.05.26	
4		Intensjonsavtale inngått		0 dager	02.02.26	02.02.26	
5		Kostnadsestimat omforent		0 dager	13.05.26	13.05.26	13AS+3 dager
6		Skisseprosjekt		50 dager	02.02.26	16.04.26	
7		Konseptutvikling (eiendomsvåg)		20 dager	02.02.26	27.02.26	4
8		Arkitektmodell, leietakerspesifisert		15 dager	02.03.26	20.03.26	7
9		Arkitekttegninger omforent		0 dager	27.03.26	27.03.26	8AS+5 dager
10		Geoteknisk rapport		10 dager	30.03.26	16.04.26	9
11		Brannteknisk rapport		10 dager	30.03.26	16.04.26	9
12		Kalkulasjon		15 dager	17.04.26	08.05.26	
13		Kostnadskalkyle - Budsjettpriser		10 dager	24.04.26	08.05.26	14;15
14	👤	Markedsundersøkelser Bygg		5 dager	17.04.26	23.04.26	10;11
15	👤	Markedsundersøkelser TEKN		5 dager	17.04.26	23.04.26	10;11
16		Aurelian - Fase 2 (Gjennomføring)		285 dager	15.05.26	20.08.27	
17		Byggesak		285 dager	15.05.26	20.08.27	
18		Nabovarsel (14 dager pålagt)		10 dager	15.05.26	29.05.26	5
19	👤	Rammesøknad		60 dager	01.06.26	14.09.26	18
20	👤	Søknad arbeidstilsynet		15 dager	15.06.26	03.07.26	19SS+10 dager
21		Søknad IG-1 (grunn og fundament)		15 dager	15.09.26	05.10.26	19
22		Søknad IG-2 (råbygg / tett bygg)		15 dager	04.01.27	25.01.27	49SA-5 dager
23		Søknad IG-3 (Innredning)		15 dager	02.03.27	23.03.27	61SA-5 dager
24		Søknad brukstillatelse		15 dager	02.08.27	20.08.27	74
25		Forprosjekt		25 dager	15.05.26	19.06.26	
26		Funksjonsbeskrivelse Bygg		20 dager	15.05.26	12.06.26	5
27		Funksjonsbeskrivelse VVS		20 dager	15.05.26	12.06.26	5
28	👤	Fastsatt effektbehov		3 dager	15.06.26	17.06.26	27
29	👤	Funksjonsbeskrivelse EL		20 dager	22.05.26	19.06.26	27SS+5 dager
30		Utarbeidelse stålmodell		10 dager	15.05.26	29.05.26	5
31		Detaljprosjekt		75 dager	15.06.26	19.10.26	
32		Arbeidstegning BYGG		60 dager	15.06.26	28.09.26	26
33		Arbeidstegning TEKN		60 dager	28.07.26	19.10.26	32SS+15 dager
34		Oppføring av bygg		200 dager	06.10.26	20.08.27	
35		Rigg		8 dager	06.10.26	15.10.26	
39		Grunnarbeider innomhus		82 dager	16.10.26	18.02.27	
44		Betongarbeider		79 dager	21.12.26	26.04.27	
48		Stål arbeider		22 dager	01.02.27	02.03.27	
51		Grunnarbeider utomhus		55 dager	03.03.27	26.05.27	
55		Fasade / tak		22 dager	03.03.27	07.04.27	
59		Innredning		59 dager	05.04.27	28.06.27	
72		Test og befaringer		28 dager	23.06.27	20.08.27	
73	👤	Integerte tester		10 dager	23.06.27	27.07.27	71SS+5 dager
74		Fullskalatest		3 dager	28.07.27	30.07.27	73
75		Forbefaring		2 dager	29.07.27	30.07.27	74SS+1 dag
76		Overtakelsesbefaring		0 dager	20.08.27	20.08.27	24

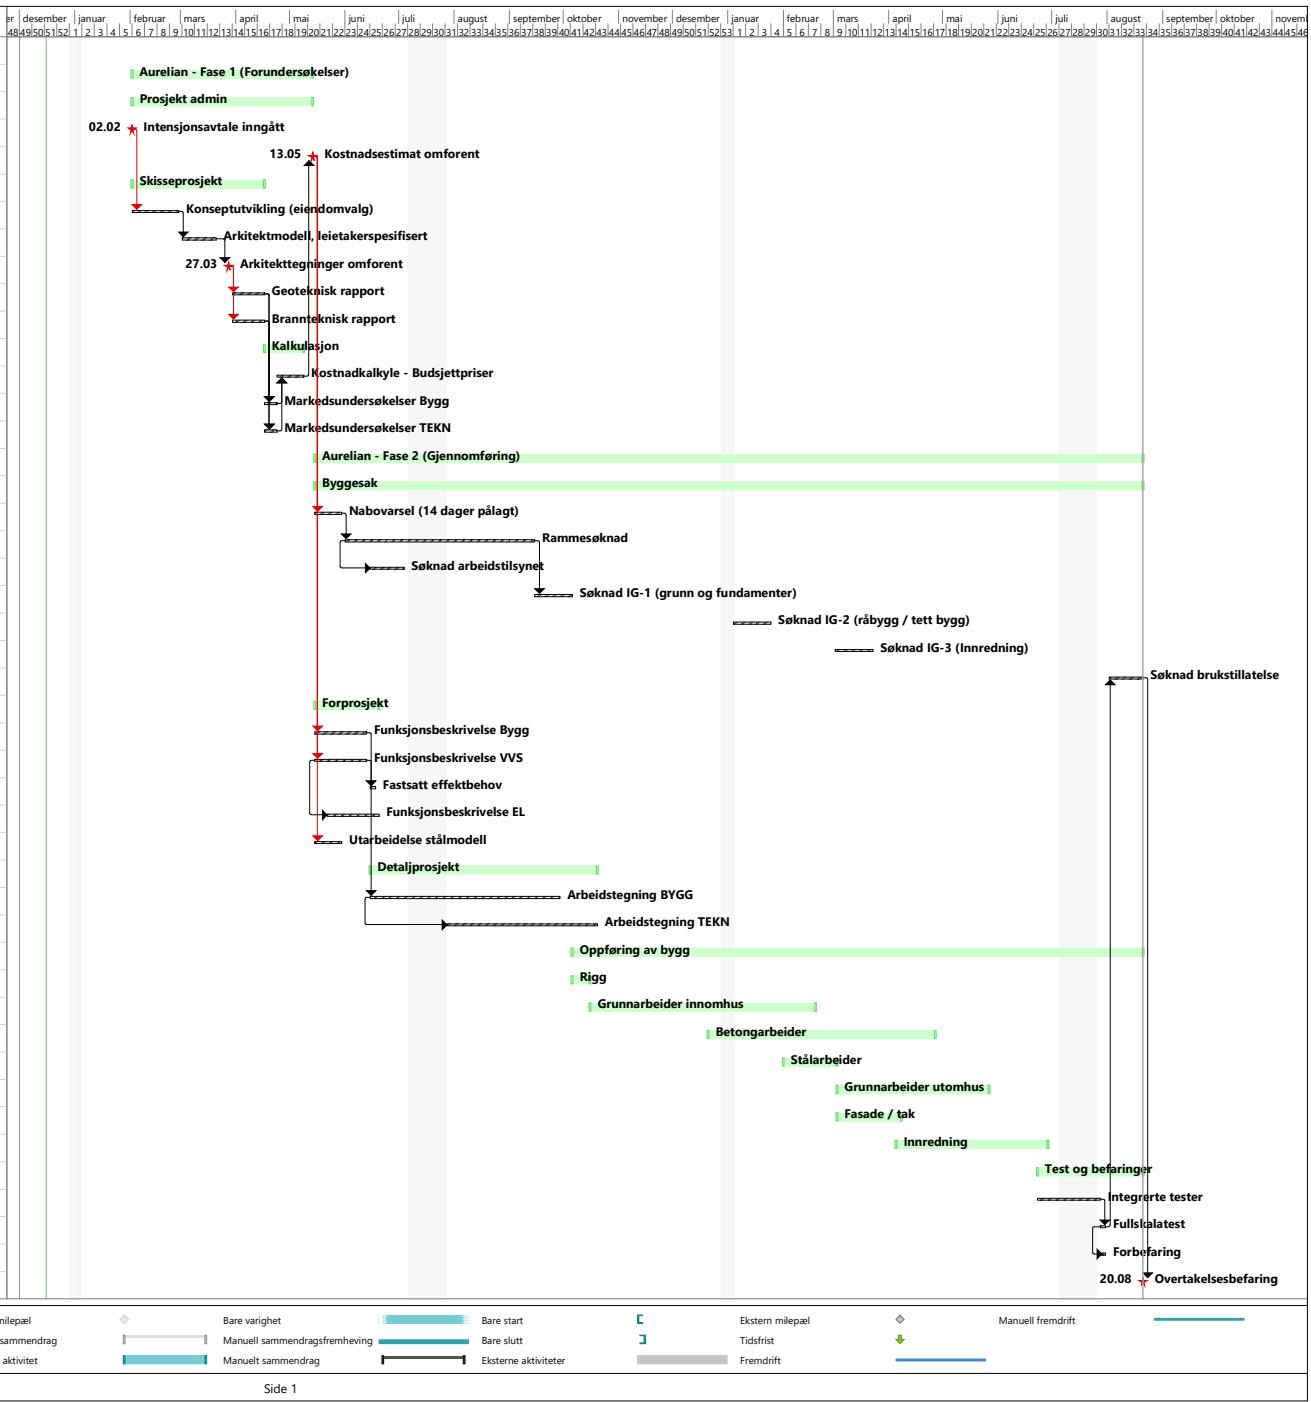

Prosjekt: Aurelian forenklet
Dato: 16.12.25

Aktivitet

Sammandrag Inaktiv milepål
Prosjektsammandrag Inaktivt sammandrag
Inaktiv aktivitet Manuell aktivitet

Bare variighet

Bare start Bare slutt
Manuell sammandragsfremheving Eksterne aktiviteter
Manuell sammandrag Fremdrift

Ekster mildepål

Tidsfrist

Manuell fremdrift
